
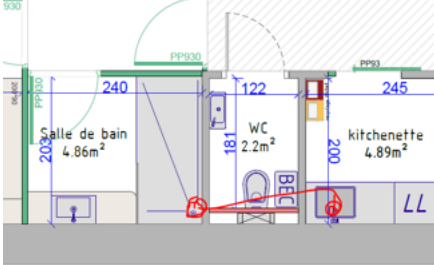


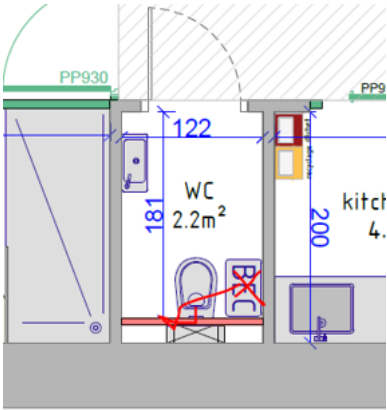



CLUB PILATES

alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
À : "gt.electricite@orange.fr" <gt.electricite@orange.fr>, "ecoplomberie33@gmail.com" <ecoplomberie33@gmail.com>, "entreprise@krobat.fr" <entreprise@krobat.fr>

- Messieurs en complément du CR de chantier

SALLE DE BAIN R+1 - - Nourrice alimentation à déplacer dans la nouvelle kitchenette pour la maintenance - A TRAITER SANS VALIDATION CLIENT - Sèche serviette, vous voulez le proposer au client ? EN ATTENTE VALIDATION CLIENT - Trappe visite pour caisson VMC – TS A PREVOIR - Contrecloison à prévoir pour réseau – TS A PREVOIR		
WC - PLOMBERIE - BEC à installer au-dessus du bati support - A TRAITER SANS VALIDATION CLIENT - Carrelage à proposer au client – TS A PREVOIR		
SOUS SOL - PLOMBERIE Alimentation réseau du SS en 16 mm – non conforme à passer en 25 mm – estimation 1000 euros - EN ATTENTE VALIDATION CLIENT		

		
<u>CLUB PILATE - SYSTEME INTRUSION</u> Pas de précisions sur le CCTP ni sur les plans Aujourd'hui une partie des câblages ont été déjà curé On dépose le boîtier, sirènes et détecteur ? ou on les laisse ?		
<u>CLUB PILATE - SYSTEME DETECTION INCENDIE</u> - Suite au curage fait par le propriétaire, le SSI était déjà en disfonctionnement (sirènes déposés et câblage endommagé) L'électricien va nous envoyer un devis pour la mise en service. -		
<u>CLUB PILATE + APPARTEMENT - ECLAIRAGE</u> - Urgent, les plans ne correspondent pas au chiffrage au niveau des interrupteurs ON FAIT COMMENT ? SURTOUT DANS LE STUDIO EN DIMMABLE		
<u>SALLE DE FORMATION ET BUREAU – R+1</u> - Sur le devis, pas de mise en peinture ni vitrification du parquet ni détail sur les prises à installer – TS A PREVOIR, EN ATTENTE CONFIRMATION CLIENT -		

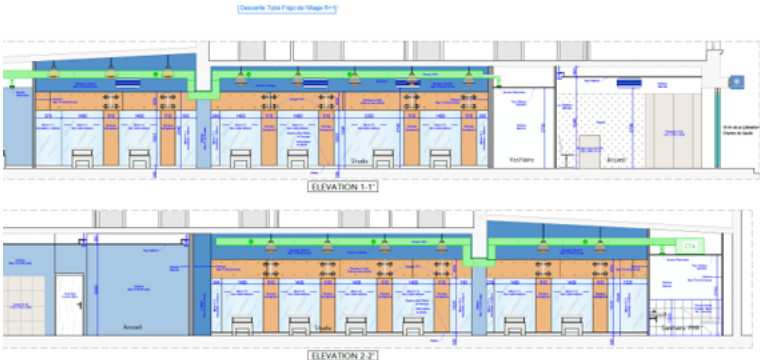		
MIROIR – STUDIO - Selon le plan ELEVATION, on a plus de 14 u de miroir Pou info, j'ai passé la commande en 6 mm + anti-éclat (pas prévus sur le devis) -		
CHAMBRE N°2 - Contre-cloison à prévoir – TS A PREVOIR, A TRAITER SANS VALIDATION CLIENT Voir photos H:\Clients\CLUB PILATES\2024 04 Bordeaux Le Bouscat\1. Arborescence projet\5. Photos\Phase travaux\20240917 VISITE CHANTIER		
