
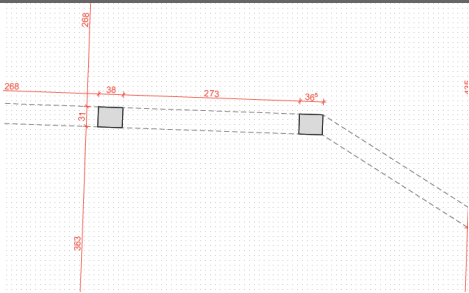
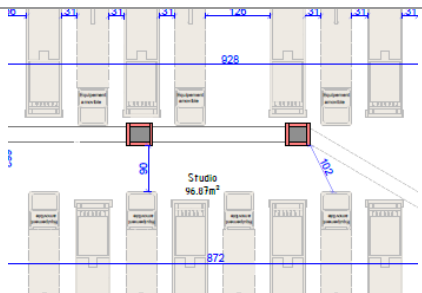
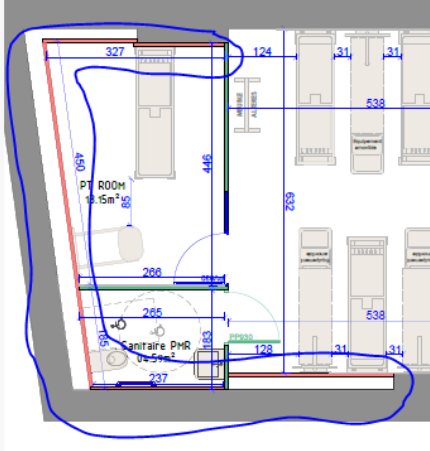
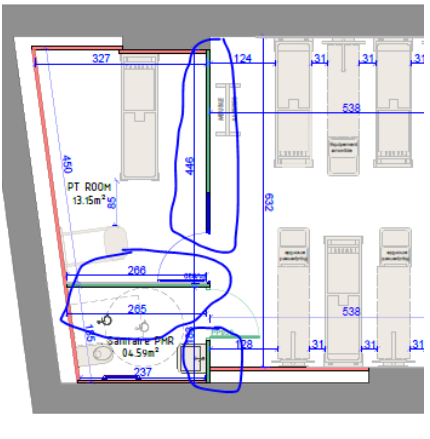



Amené et repli du matériel pendant la durée des travaux	
Curage des poteaux structures	
Fourniture et pose de contre-cloison 61/48 - EI30 . Ossature en acier galvanisé 48mm . Parement simple BA13 flamme . Laine de verre ép.120mm R = 3.00m 2.K/W . Compris bandes Localisation: doublage des poteaux structurants	
Fourniture et pose de contre-cloison 61/48 Ossature en acier galvanisé 48mm . Parement simple BA13 standard . Laine de verre ép.120mm R = 3.00m 2.K/W . Compris bandes Localisation: Périphérie de la coque sans doublage existant + doublage des poteaux structurants	
Cloison placostil 72/48 Ossature acier galvanisé 48 mm . Laine minérale 45 mm en isolation . Parement plâtre BA 13 12,5 mm . Bande à joint comprise Localisation: Cloison vestiaire, sanitaire PMR	

Plafond Minéral 600*600
Ossature apparente T24 blanc
 . Dalle minérale 600 x 600
 . Type: Advantage
 . Marque Ecophon
Localisation: Plafond vestiaire sanitaire pmr et pt room

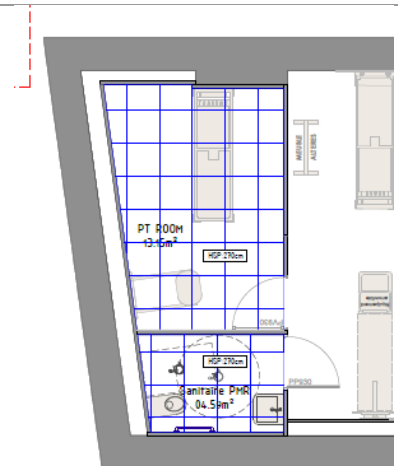


Fourniture et pose de Cloison SAA 160 composée de :


- Rail et montant de 90
- Parement BA25 Duo'Tech standard
- Épaisseur fini 16cm
- Laine minérale ép.45mm doublée
- Entraxe des montants 0.45cm
- Montants doublés
- Cornières CR2 en tête et pieds
- Compris bandes
- EI60 et Ra = 66dB

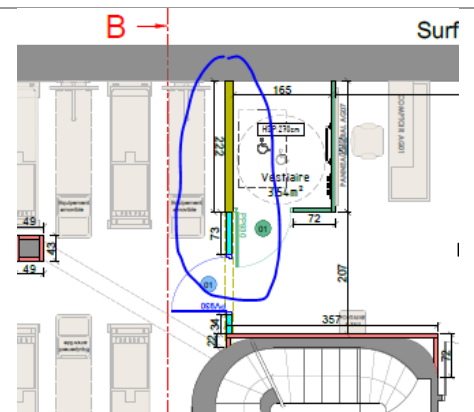

Plafond en plaque de plâtre
Ossature acier galvanisé
 . 1 peau BA13
 . Bande à joint
 . 2 passes d'enduit
Localisation: accueil

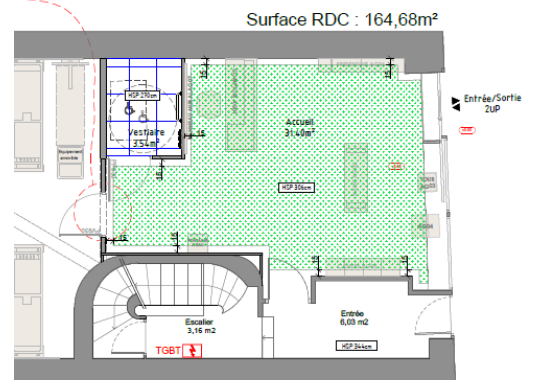


Pose seul d'un sol PVC
 *Lame PVC imitation bois
 *Hors fourniture de colle
Localisation : locaux accessible au public



Plinthe medium 10 cm
 . ép.10mm


Plinthes RDC

Fourniture et pose d'enduit en plein
 . Compris rebouchage préalable
 Localisation: plafond accueil

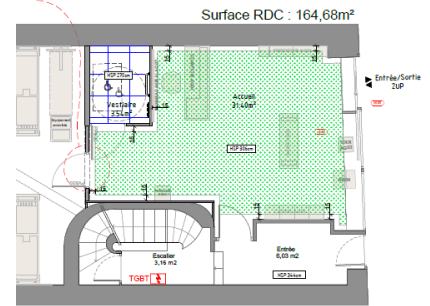


R+1

Curage des deux cloisons non réalisées par le bailleur

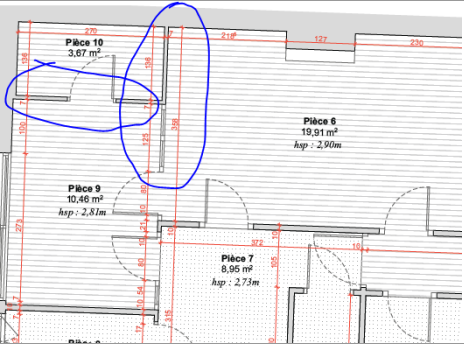


Dépose de la baie vitrée existante à remplacer


Fourniture et pose de contre-cloison 61/48 . Ossature en acier galvanisé 48mm
 Parement simple BA 13 standard
 . Laine de verre ép.120mm R = 3.00m 2.K/W
 . Compris bandes
 Localisation: WC / SDB + chambre 2

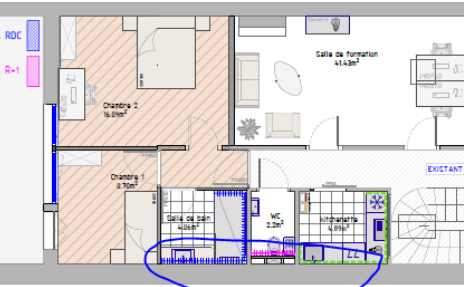

Cloison placostil 72/48
 Ossature acier galvanisé 48 mm
 . Laine minérale 45 mm en isolation
 . Parement plâtre BA 13 12,5 mm
 . Bande à joint comprise
 Localisation: chambre 1 et salle de bain

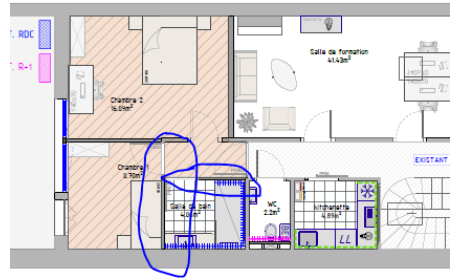

Plagond minerale 600x600
 Ossature apparente T24 blanc
 . Dalle minérale 600 x 600
 . Type: Advantage
 . Marque Ecophon
 Localisation:

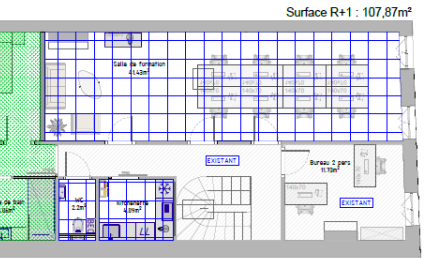

Seulement fourniture de matériel

Plafond en plaque de plâtre


. Ossature acier galvanisé

. 1 peau BA13

. Bande à joint

. 2 passes d'enduit


Localisation: Zone appartement

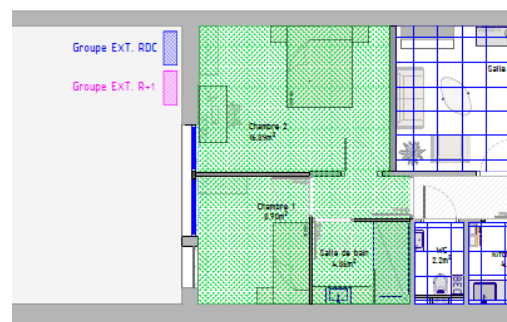

Fourniture et pose d'une étanchéité sous carrelage

Remonté murale 1,5m

Localisation: SdB

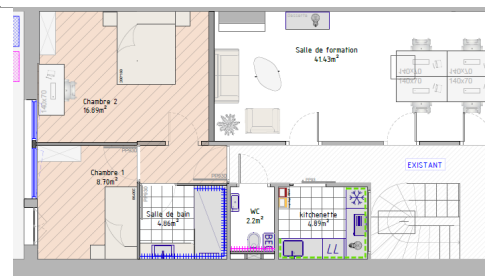


Fourniture et pose de ragréage fibré

. (ép. 2/3 mm)

. Fourniture du primaire


. Fourniture et pose de fixateur adapté au support

Localisation: SdB / Cuisine



Pose seule de carrelage 60x60

Localisation: SdB / Cuisine




Il est bien indiqué cette surface comprend
uniquement R+1 et non RdC. 10m² et localisation :
SdB / Cuisine

Fourniture et pose d'enduit en plein


. Compris rebouchage préalable





Localisation: Etage arrière sur toit




Pose seule de faïence

Localisation: Cuisine / SdB



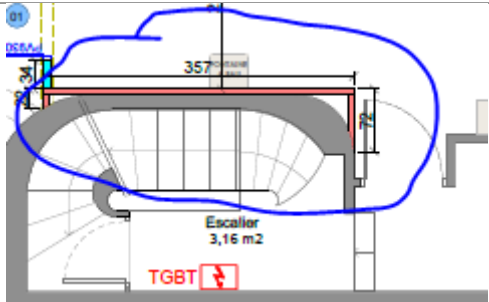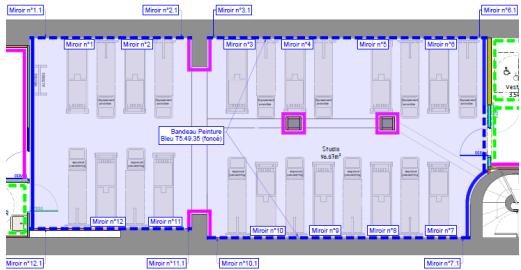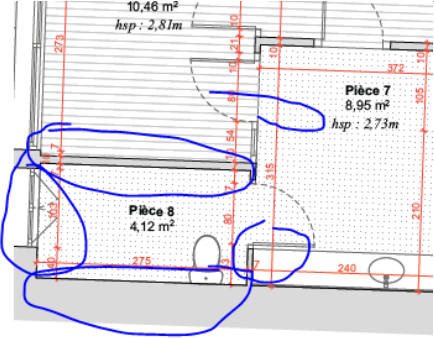	Il est bien indiqué cette surface comprend uniquement R+1 et non RdC. 22m² et localisation : SdB / Cuisine
Fourniture et pose de plinthes . Profil identique ou équivalent aux existantes	Plinthes R+1 réalisés
Commande no CF1900003665	
Fourniture et pose de contre-cloison 61/48 Ossature en acier galvanisé 48mm . Parement simple BA13 standard . Laine de verre ép.120mm R = 3.00m 2.K/W . Compris bandes Localisation: ACCUEIL TS SIGNE	
Création d'une gorge lumineuse en plâtre Type techniplaque Selon modèle proposé	Gorge Lumineuse RdC
Pose de bloc porte stratifié pour cloison placo compris ferme porte Localisation: Espace Restrooms et Vestiaire	
Fourniture et pose de miroir selon concept (14 miroirs) - dimensions de 1400x1825mm à 2352x1825mm Argentée Claire 6 mm Anti-Eclat JPP	
Curage des cloisons de Chambre 1 R+1 (NP)	
	Pièce 8 = Chambre 1

**Pose de bloc porte stratifié pour
cloison placo compris ferme porte Localisation: Appartement**

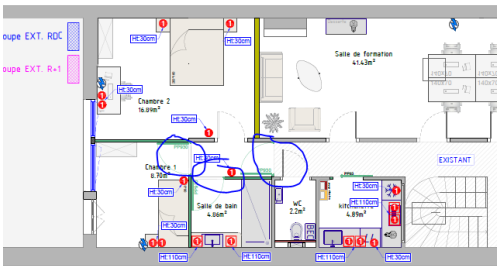

**Fourniture et pose de Cloison SAA 160 composée
de :**

- Rail et montant de 90
- Parement BA25 Duo'Tech standard
- Épaisseur fini 16cm
- Laine minérale ép.45mm doublée
- Entraxe des montants 0.45cm
- Montants doublés
- Cornières CR2 en tête et pieds
- Compris bandes
- EI60 et Ra = 66dB


Localisation / entre salle de formation et appartement




Devis D202400055

**Forfait pour ouverture de mur en placo pour la mise en place d'un
renfort sur la partie haute et bas**

**Doublage contre-cloison 61/48 en demi-stil
ossature métallique en 25mm/48mm et BA13**

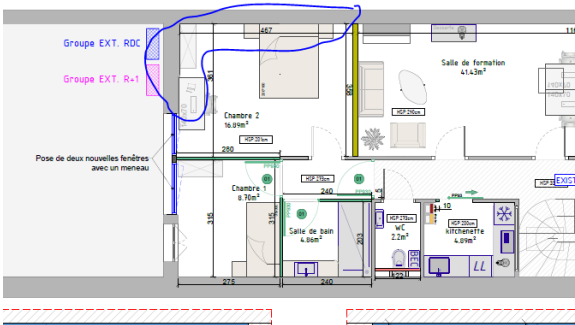


**Doublage contre-cloison 61/48 en demi-stil
ossature métallique en 25mm/48mm et BA13**

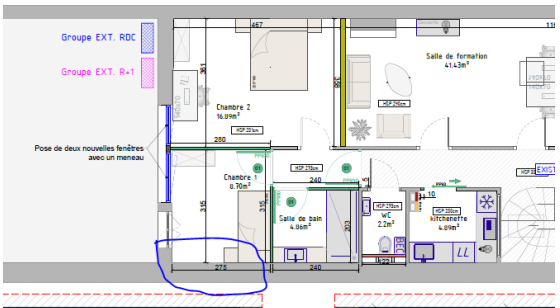


Devis D202400058


Forfait pour l'installation de deux fenêtres au R+1:
- F/P Fenêtre 1
- F/P Fenêtre 2
- Mise en place de Bardage
- Reprise de maçonnerie pour l'installation des fenêtres
Localisation: R+1

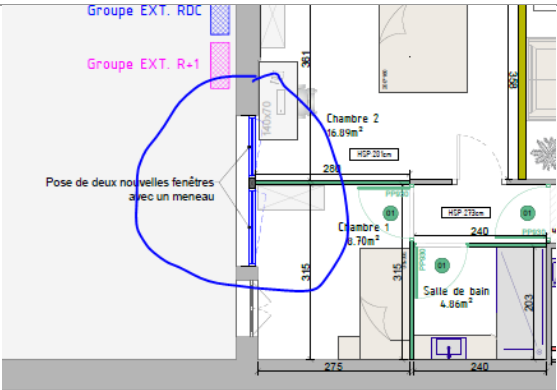


Fourniture et pose de ragréage fibré . (ép. 2/3 mm)
Localisation: Chambre 1

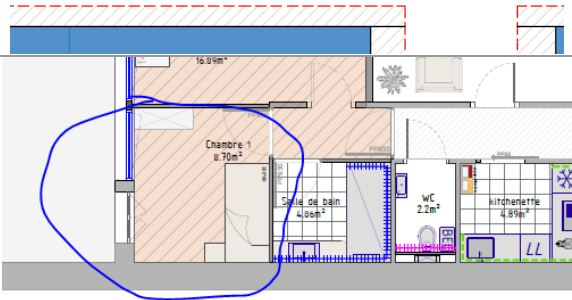

Fourniture et pose d'une toile de verre
Localisation: SdR au R+1

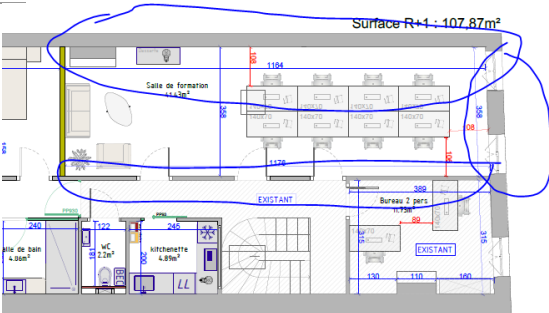

Traitement des tranchées au mur SdR au R+1

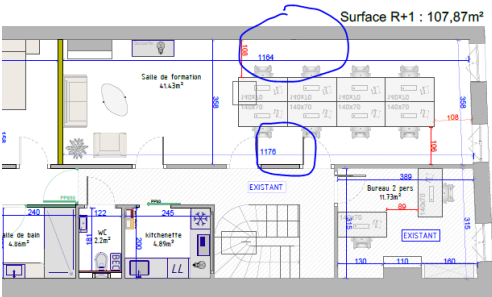


Forfait pour manutention 2P 1/2 J HD
Fourniture et pose de trappe de visite 500x500

Trappe de visites

Devis D202400060


Fermeture en plaque de plâtre plafond niveau passage des réseaux RdC

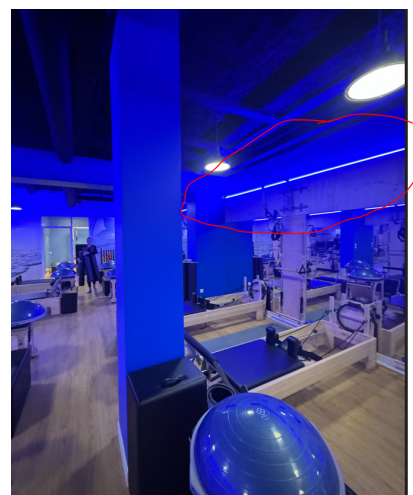


Coffrage de chemin de câble sous plafond d'accueil RdC



Curage et évacuation de la porte couloir avec support plâtrerie, finition en BA13 avec bandes & peinture

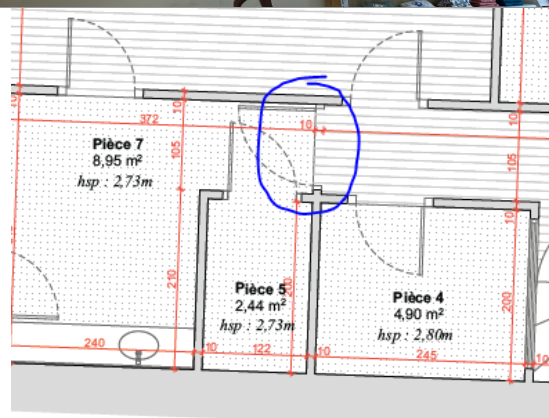


Plafond en BA13 entre circulation et couloir

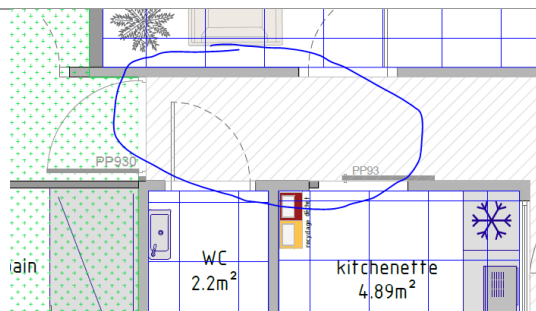

Enlèvement de la dalle bois et mise en place d'un OSB 16mm au sol R+1, fixation et réparation des parquets existants, calfeutrement des espaces entre cloison et le sol




Pose carrelage salle de bain RdC

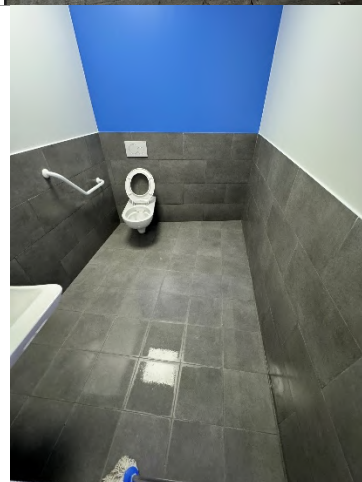

Forfait pour l'installation des plaques BA13 dans les ouvertures existantes qui ne sont pas dans les plans
Localisation: Enduit 2 couches Accueil TS Signe RdC,
Sép. Studio RdC, Retour mur SdB au R+1



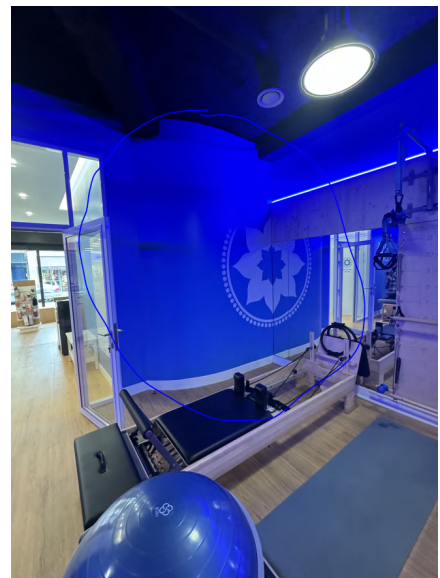

Peinture de la coffrage en bois non réalisée par l'entreprise de peinture électrostatique



Peinture au dessus la porte d'entrée (changement du plan)



**Calfeutrement et finition en BA13 niveau
périphérie fenêtres extérieure R+1**



Fourniture et pose BA13 collée avec bandes et finitions R+1 plafond chambre 1



Fourniture et pose de miroir selon concept (8 miroirs) - dimensions de 392x1825mm à 1316x1825mm Argentée Claire 6 mm Anti-Eclat JPP

Miroirs
