

84 sur un grand nombre

dossier chiffrage Club Pilates 33110 Le Bouscat

Externes

Boîte de réception x

a

alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

À moi

mar. 20 août 2024 15:06

Bonjour Enes

Tu trouveras en PJ les documents pour le chiffrage du dossier Club Pilates 33110 Le Bouscat.

Une visite de site sera à prévoir semaine prochaine (date a caler).

Restant a ta disposition

Bien a toi

A17

ALEXANDRE MÉMIN

ATELIER 17

OPC-MOE-AMO

06 63 80 22 36

Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

2 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail

DOSSIER OPC.zip

PLAN EXISTANT [...]

Répondre

Transférer

83 sur un grand nombre

chiffrage Club Pilates 33110 Le Bouscat

Externes

Boîte de réception x

a

alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

À moi

mer. 21 août 2024 15:22

Bonjour

En complément du premier envoi trouves ci-joint les DPGF pour le R+1 et le TSN*1

Bien a toi

A17

ALEXANDRE MÉMIN

ATELIER 17

OPC-MOE-AMO

06 63 80 22 36

Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

2 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail

CLUB PILATE BO...

CLUB PILATE BO...

Répondre

Transférer

club pilates le bouscat plans EXE V1 Externes Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
À moi ▾

ven. 23 août 2024 12:03 ☆ ↶ ⋮

Bonjour
Veuillez trouver en PJ la liasse de plan EXE V1 pour le projet Club Pilates 18 avenue de la Libération CDG 33110 Le Bouscat.

Bien cordialement



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
À moi ▾

ven. 23 août 2024 12:05 ☆ ↶ ⋮

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



↶ Répondre

↷ Transférer

TR: club pilates le bouscat plans EXE V1 annule et remplace Externes Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
À moi ▾

ven. 23 août 2024 12:15 ☆ ↶ ⋮

Bonjour
Veuillez trouver en PJ la liasse de plan EXE V1 pour le projet Club Pilates 18 avenue de la Libération CDG 33110 Le Bouscat.

chiffrer les points suivant en pose seulement


- Sol PVC
- Bloc porte double vitrage cadre alu
- Cloison amovible acoustique ossature alu
- Enseigne
- Carrelage 60x60 sdb /cuisine
- Faïence sdb /cuisine

Bien cordialement



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



projet Club Pilates Externes Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
À moi, gouelec.services@gmail.com

ven. 23 août 2024 12:37

Rdv le27/08 a 16h au 18 avenue de la Libération CDG 33110 Le Bouscat pour le projet Club Pilates.

cordialement



Envoyé à partir de [Courier](#) pour Windows



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À alexandre, gouelec.services@gmail.com

ven. 23 août 2024 14:20

Merci Alexandre,

Bien reçu le RV,

Cordialement
Enes

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

Répondre

Répondre à tous

Transférer

79 sur un grand nombre

Club Pilates Le Bouscat Design Package

Externes

Boîte de réception x

a

alexandre memin ATELIER17

<am@atelier-17.fr>

À moi

lun. 26 août 2024 15:53

En complément des précédents envois veuillez trouver en PJ le document Design Package.

Bien cordialement

A17

ALEXANDRE MÉMIN

ATELIER 17

OPC-MOE-AMO

06 63 80 22 36

Envoyé à partir de [Courier](#) pour Windows

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail

PDF

CP Design Intent Package (DIP).pdf

7 MB

Répondre

Transférer

78 sur un grand nombre

TR: club pilates plans EXE V2

Externes

Boîte de réception x

a

alexandre memin ATELIER17

<am@atelier-17.fr>

À moi

mar. 27 août 2024 10:04

Bonjour veuillez trouver en PJ les plans EXE V2

Bien cordialement

A17

ALEXANDRE MÉMIN

ATELIER 17

OPC-MOE-AMO

06 63 80 22 36

Envoyé à partir de [Courier](#) pour Windows

3 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail

PDF

IS_CLUB PILATE_...

PDF

IS_CLUB PILATE_...

PDF

IS_CLUB PILATE_...

Répondre

Transférer



ven. 30 août 2024 15:56

Bien cordialement



📎 lun. 2 sept. 2024 19:47 ☆ ↩ ⋮

Bien à toi,
Enes



74 sur un grand nombre

Club Pilates

Externes

Boîte de réception x

a

alexandre memin ATELIER17

<am@atelier-17.fr>

À moi

Enes

Tu trouveras ton devis annoté...on en parle par telephone demain

Bien a toi

A17

ALEXANDRE MÉMIN

ATELIER 17

OPC-MOE-AMO

06 63 80 22 36

Envoyé à partir de

Courrier

pour Windows

1 pièce jointe

Analyse effectuée par Gmail

pdf

devis KROBAT

anoté.pdf

2.4 MB

K

ENES DOGAN

<entreprise@krobat.fr>

À alexandre

Bonjour Alexandre,

Merci bien de trouver ci-joint le devis à jour.

Bien à toi,

Enes

—

Krobat Construction

1 Avenue Neil Armstrong

33700 Mérignac

05.23.53.14.96

ven. 6 sept. 2024 12:35

CLUB PILATE BORDEAUX LE BOUSCAT - Confirmation de collaboration pour le chantier



Externes Boîte de réception x



Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

ven. 6 sept. 2024 17:54 ☆ ↶ ⋮

À moi, atelier, Stephane, Emilien ▾

Bonjour,

Je tenais à vous confirmer que nous allons bien travailler ensemble sur le chantier CLUB PILATE à Bordeaux Le Bouscat. Le bon de commande est en cours de préparation et vous sera envoyé très prochainement.

Pour organiser le démarrage des travaux, je vous invite à contacter notre maître d'œuvre, Alexandre MENIN, afin de convenir ensemble des modalités et du planning.

Si vous avez des questions, je reste bien entendu à votre disposition.

Bien à vous,



Carmen PEREZ CERVERA

Directeur de Projet

07 60 61 64 82

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe Isospace - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

...

[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)

↶ Répondre

↶ Répondre à tous

➡ Transférer

Club Pilates le Bouscat RDV de chantier " kickoff " Externes Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
À gt.electricite@orange.fr, moi, ecoplomberie33@gmail.com, Carmen, Emilien, Stephane ▾

lun. 9 sept. 2024 10:49 ☆ ↶ ⋮

Bonjour
Je vous informe que le 1^{er} rdv de chantier se tiendra ce mercredi 11/09/2024 à 10h00 sur le chantier .
Votre présence est impérative

En vous remerciant par avance pour votre disponibilité

Bien cordialement



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows



Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>
À alexandre, gt.electricite@orange.fr, moi, ecoplomberie33@gmail.com, Emilien, Stephane ▾

lun. 9 sept. 2024 14:20 ☆ ↶ ⋮

Bonjour à tous,

Merci de signer le contrat de sous-traitance sur PROVIGIS avec ISOSPACE RETAIL PARTNER

Bien à vous,



Carmen PEREZ CERVERA
Directeur de Projet
07 60 61 64 82

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe Isospace - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

Club pilates le Bouscat. Boite a clefs Externes Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

À moi, ecoplomberie33@gmail.com, gt.electricite@orange.fr, Carmen, Emilien ▾

📧 lun. 9 sept. 2024 16:22 ☆ ↶ ⋮

Bonjour

Je vous informe que j'ai mis en place une boîte a clefs code 9597
dedans se trouvent la clef de la porte et la clef du rideau métallique électrique.

Merci de penser a refermer rideau et porte lors de votre départ et remettre les clefs dans la boîte

Bien cordialement
Alexandre Mémin



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



↶ Répondre

↶ Répondre à tous

➦ Transférer

Club Pilates Le Bouscat PLANNING

Externes

Boîte de réception x



a

alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
À ecoplomberie33@gmail.com, moi, gt.electricite@orange.fr, Carmen, Emilien, Stephane ▾

📧 lun. 9 sept. 2024 16:31

★

↩️

⋮

Bonjour a tous

Pour mémoire vous trouverez en PJ le planning qui vous a déjà été transmis avec un démarrage le 09/09/2024 et une livraison le 15/10.

Nous comptons sur votre vigilance pour le respecter car comte tenu des engagements commerciaux aucun retard ne pourra etre accepté par le client.

Comptant sur votre engagement et votre professionnalisme

Bien cordialement



Envoyé à partir de [Courier](#) pour Windows

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ

🔗



↩️ Répondre

↩️ Répondre à tous

➡️ Transférer

Club Pilates Le Bouscat CR chantier N°1 Externes Boîte de réception x

a

alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

À moi, gt.electricite@orange.fr, ecoplomberie33@gmail.com, dsvconcept33@yahoo.fr, Emilien, Carmen, Stephane ▾

ven. 13 sept. 2024 10:47

Bonjour a tous vous trouverez en PJ le CR de chantier N°1.

Je vous rappelle que le planning est très serré et que nous ne pourrons pas avoir de temps supplémentaire. Aussi merci de nous faire part de toutes vos remarques ou suggestions sans délais

Le prochain RDV de chantier se déroulera le mardi 17/09 à 9h00

Bien cordialement



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

3 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



K

entreprise@krobat.fr

ven. 13 sept. 2024 12:18

Bonjour,

Nous ne pourrons pas être présents mardi matin.

Est-il possible de reporter la réunion à mardi à 14h00 ?

Bien Cordialement,
Enes DOGAN

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ

🔗



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À alexandre ▾

📧 ven. 6 sept. 2024 12:35 ☆ ↶ ⋮

Bonjour Alexandre,

Merci bien de trouver ci-joint le devis à jour.


Bien à toi,
Enes

—

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ

🔗



↶ Répondre

↷ Transférer

[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)



Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

À atelier, Stephane, Emilien, Laurène, moi ▾

12 sept. 2024 19:03 ☆ ↶ ⋮

Bonjour Enes et Alexandre,

Ci-joint la première commande. (En attente de la dépose du podium)

Merci de nous envoyer un devis pour

- Fourniture et pose de miroirs en 6 mm + anti-éclat selon plan transmis
- Pose de bloc porte et ferme porte non fournis
- Pose tapis entrée (il s'agit d'un tapis PMR)
- Fourniture et pose des fenêtres + meneau bardage

Bien à vous,



Carmen PEREZ CERVERA

Directeur de Projet

07 60 61 64 82

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe Isospace - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

De : Romain DUCRET <romain.ducret@isospace.fr>

Envoyé : jeudi 12 septembre 2024 16:48

À : Enes DOGAN <entreprise@krobat.fr>

Cc : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

Objet : Commande N°CF1900003659 / RETAIL PARTNERS / KROBAT

Bonjour,

...

[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)

Objet : Commande N°CF1900003659 / RETAIL PARTNERS / KROBAT

Bonjour,

...

[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À Carmen, atelier, Stephane, Emilien, Laurène ▼

📧 13 sept. 2024 16:14 ☆ ↩ ⋮

Bonjour Carmen,

Merci bien de trouver ci-joint le devis pour les éléments en complément.
Il me manque le devis pour les fenêtres que je vais l'avoir Lundi.

Bien à toi,
Enes

...

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



65 sur un grand nombre

K

ENES DOGAN

<entreprise@krobat.fr>

À Carmen, alexandre

13 sept. 2024 16:27

Rebonjour,

Il manque la cloison SAA 140mm dans la commande (niveau R+1).
Est-ce que cela serait à ajouter au devis ?

Merci,
Cordialement

C

Carmen PEREZ CERVERA

<carmen.perez-cervera@isospace.fr>

À moi, alexandre

13 sept. 2024 17:34

Bonjour,

Suite à notre appel, oui c'est un oubli de ma part... Il sera dans cette deuxième commande

Bien à vous,

Carmen PEREZ CERVERA

Directeur de Projet

07 60 61 64 82

https://www.isospace.fr

24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe Isospace - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

Envoyé : vendredi 13 septembre 2024 16:28

À : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

Cc : alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

Objet : Re: Commande N°CF1900003659 / RETAIL PARTNERS / KROBAT

63 sur un grand nombre

Club pilates

Externes

Boîte de réception x

a

atelier 17 <am@atelier-17.fr>

À moi, Carmen, emilien.collin@isospace.fr, Stephane

lun. 16 sept. 2024 09:00

Bonjour

Merci de me faire un retour sur les sols du R+1 au niveau des podiums.

Cordialement

Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À atelier, Carmen, emilien.collin@isospace.fr, Stephane

lun. 16 sept. 2024 11:26

Bonjour,

Suite à notre passage de ce week-end, au niveau de podium il y a 4 couches de matière avant d'être niveau parquet existant: deux revêtements su sol, une couche ragréage et une couche parquet supplémentaire (voir photos).

Pour le sol RdC: Il existe des irrégularités comprises entre 4 et 12 mm réparties sur la surface totale. Il ne sera pas possible de mettre en place du PVC en lames ou en dalle à l'état actuel.

Cordialement,

Enes DOGAN

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

4 pièces jointes

Analyse effectuée par Gmail



62 sur un grand nombre

Club Pilates chiffrages en attente

Externes

Boîte de réception x

a

alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

À moi, Carmen, Emilien, Stephane

mar. 17 sept. 2024 10:07

Bonjour

Nous sommes toujours en attente de

- votre chiffrage pour les 2 fenestres du R+1
- Votre chiffrage pour la mise en place de renforts bois comme vu sur site et tels que décrits dans les pages 25 a 28 du Design Intent Pack

Dans l'attente

cordialement



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

Répondre

Répondre à tous

Transférer

Club Pilates CR de chantier N°2 Externes Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

À gt.electricite@orange.fr, moi, ecoplomberie33@gmail.com, maman, Carmen, Emilien, Stephane ▾

mer. 18 sept. 2024 13:49 ☆ ↶ ⋮

Bonjour a tous vous trouverez en PJ le CR de chantier N°2.

Je vous rappelle que le planning est très serré et que nous ne pourrons pas avoir de temps supplémentaire.
Aussi merci de nous faire part de toutes vos remarques ou suggestions sans délais

Le prochain RDV de chantier se déroulera le mardi 24/09/2024 a 14h00

Bien cordialement



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



↶ Répondre

↶ Répondre à tous

➡ Transférer

CLUB PILATES Externes Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

À gt.electricite@orange.fr, moi, ecoplomberie33@gmail.com, moi ▾



mer. 18 sept. 2024 14:11 ☆ ↶ ⋮

• Messieurs en complément du CR de chantier

SALLE DE BAIN R+1 - • Nourrice alimentation à déplacer dans la nouvelle kitchenette pour la maintenance - A TRAITER SANS VALIDATION CLIENT • Sèche serviette, vous voulez le proposer au client ? EN ATTENTE VALIDATION CLIENT • Trappe visite pour caisson VMC – TS A PREVOIR • Contreclous à prévoir pour réseau – TS A PREVOIR		
WC - PLOMBERIE • BEC à installer au-dessus du bati support - A TRAITER SANS VALIDATION CLIENT • Carrelage à proposer au client – TS A PREVOIR		
SOUS SOL - PLOMBERIE • Alimentation réseau du SS en 16 mm – non conforme à passer en 25 mm – estimation		

SOUS SOL - PLOMBERIE Alimentation réseau du SS en 16 mm – non conforme à passer en 25 mm – estimation 1000 euros - EN ATTENTE VALIDATION CLIENT		
CLUB PILATE - SYSTEME INTRUSION Pas de précisions sur le CCTP ni sur les plans Aujourd'hui une partie des câblages ont été déjà curé On dépose le boîtier, sirènes et détecteur ? ou on les laisse ?		
CLUB PILATE - SYSTEME DETECTION INCENDIE Suite au curage fait par le propriétaire, le SSI était déjà en disfonctionnement (sirènes déposés et câblage endommagé) L'électricien va nous envoyer un devis pour la mise en service.		
CLUB PILATE + APPARTEMENT - ECLAIRAGE Urgent, les plans ne correspondent pas au chiffrage au niveau des interrupteurs ON FAIT COMMENT ? SURTOUT DANS LE STUDIO EN DIMMABLE		
SALLE DE FORMATION ET BUREAU – R+1		

chiffrage au niveau des interrupteurs ON FAIT COMMENT ? SURTOUT DANS LE STUDIO EN DIMMABLE		
SALLE DE FORMATION ET BUREAU – R+1 Sur le devis, pas de mise en peinture ni vitrification du parquet ni détail sur les prises à installer – TS A PREVOIR, EN ATTENTE CONFIRMATION CLIENT		
MIROIR – STUDIO Selon le plan ELEVATION, on a plus de 14 u de miroir Pou info, j'ai passé la commande en 6 mm + anti-éclat (pas prévus sur le devis)		
CHAMBRE N°2		

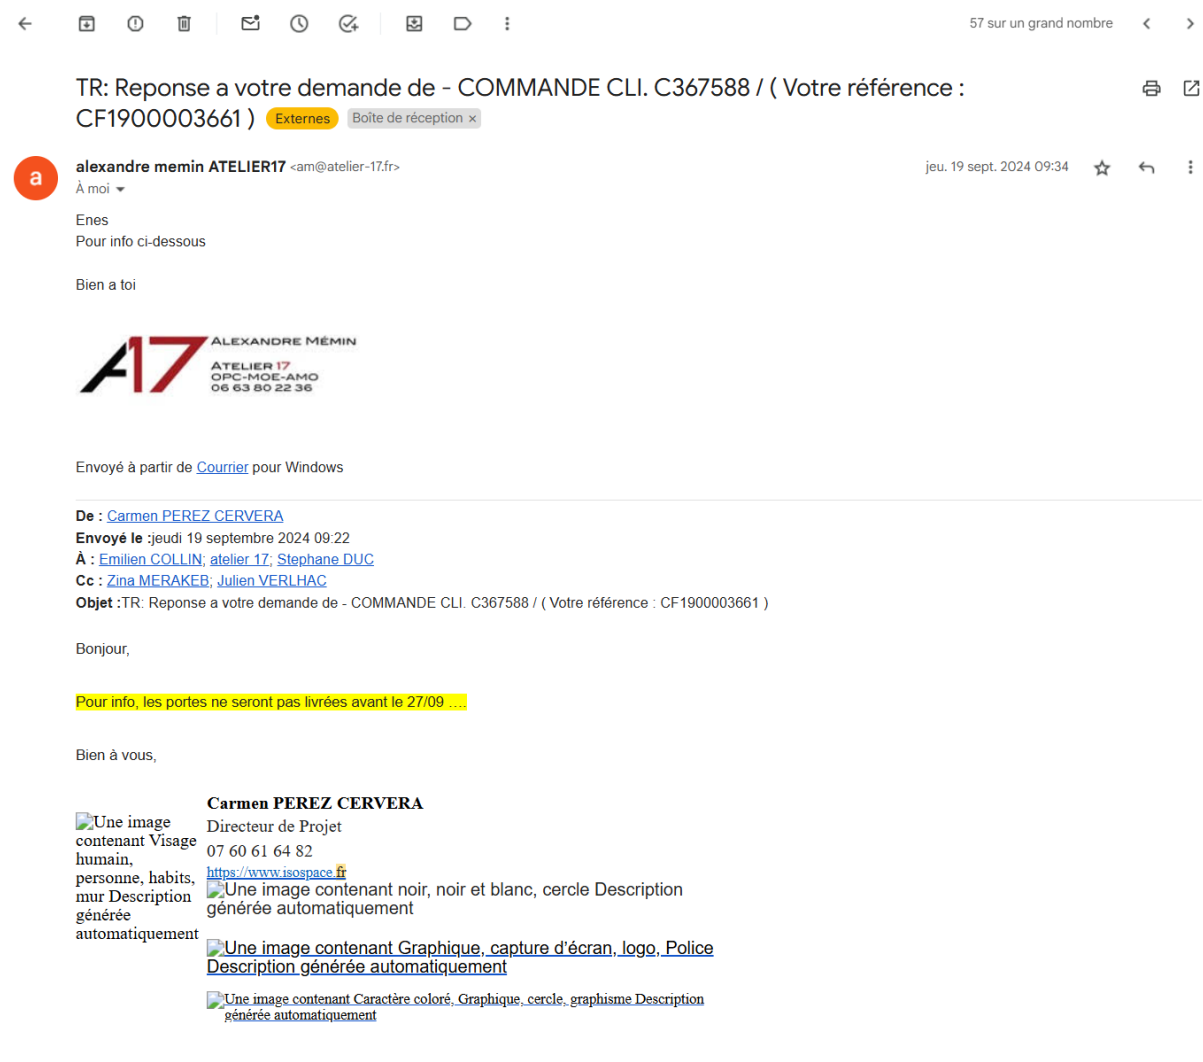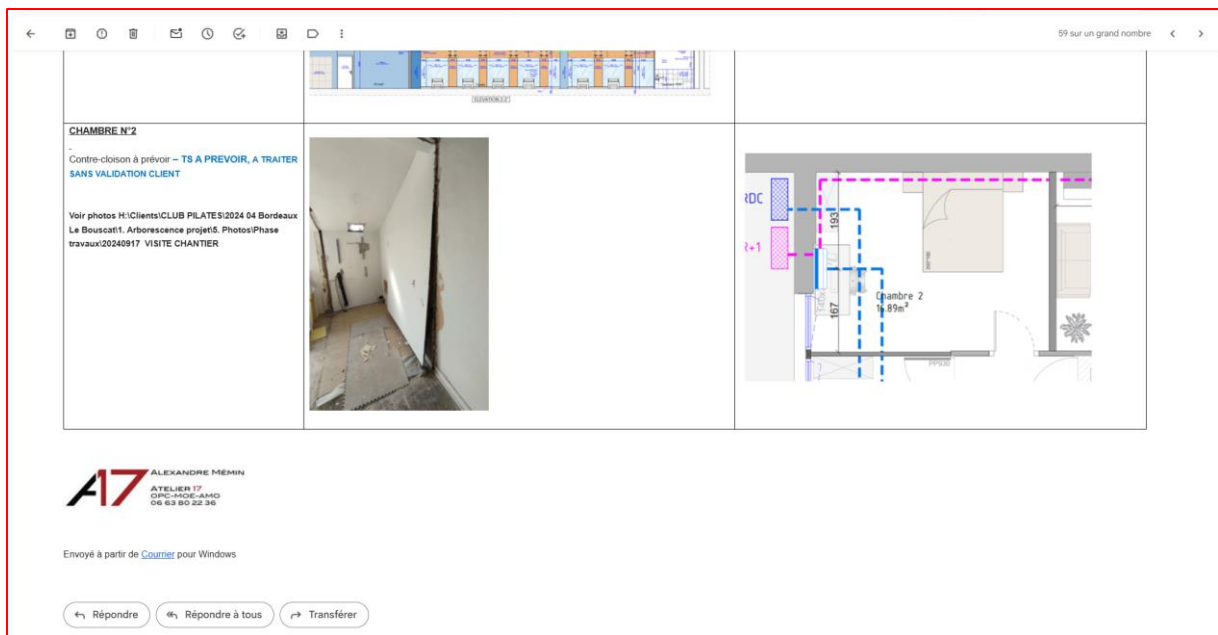

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À alexandre ▾

jeu. 19 sept. 2024 08:45

Bonjour Alexandre,

Merci bien de trouver ci-joint le devis pour les renforts, doublages à R+1 et la menuiserie extérieur de Club Pilates à Bordeaux

Bien à toi,
Enes

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



← Répondre

↪ Transférer

De : Fabre, Aubervilliers <Aubervilliers@fabre-lebeau.fr>
Envoyé : jeudi 19 septembre 2024 09:06
À : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>; Morel, Pierre-come <Pierre-Come.Morel@fabre-lebeau.fr>
Cc : Lydie LECOUR <lydie.lecour@isospace.fr>
Objet : RE: Reponse a votre demande de - COMMANDE CLI. C367588 / (Votre référence : CF1900003661)

Bonjour,

Enlèvement prévu pour le 27.09.2024

Cordialement



L'équipe Commerciale

- ☐ 01 53 56 38 38
- ☐ aubervilliers@fabre-lebeau.fr
- ☐ 114 Rue Léopold Réchossière
- ☐ 93 300 Aubervilliers
- ☐



De : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>
Envoyé : mercredi 18 septembre 2024 17:51
À : Fabre, Aubervilliers <Aubervilliers@fabre-lebeau.fr>; Morel, Pierre-come <Pierre-Come.Morel@fabre-lebeau.fr>
Cc : Lydie LECOUR <lydie.lecour@isospace.fr>
Objet : TR: Reponse a votre demande de - COMMANDE CLI. C367588 / (Votre référence : CF1900003661)

Bonjour,

S'il vous plaît, pourriez-vous nous confirmer une date d'enlèvement ?

Envoyé : mercredi 18 septembre 2024 17:51
À : Fabre, Aubervilliers <Aubervilliers@fabre-lebeau.fr>; Morel, Pierre-come <Pierre-Come.Morel@fabre-lebeau.fr>
Cc : Lydie LECOUR <lydie.lecour@isospace.fr>
Objet : TR: Reponse a votre demande de - COMMANDE CLI. C367588 / (Votre référence : CF1900003661)

Bonjour,

S'il vous plaît, pourriez-vous nous confirmer une date d'enlèvement ?

Vendredi 20/09 ou Lundi 23/09 ?

Bien cordialement,

 Une image contenant Visage humain, personne, habits, mur Description générée automatiquement

Carmen PEREZ CERVERA
Directeur de Projet
07 60 61 64 82
<https://www.isospace.fr>

 Une image contenant noir, noir et blanc, cercle Description générée automatiquement

 Une image contenant Graphique, capture d'écran, logo, Police Description générée automatiquement



 Une image contenant Caractère coloré, Graphique, cercle, graphisme Description générée automatiquement

 Une image contenant Graphique, symbole, logo, Police Description générée automatiquement

24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt
Groupe Isospace - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

De : AUBERVILLIERS F & L <AUBERVILLIERS@FABRE-LEBEAU.FR>
Envoyé : lundi 16 septembre 2024 12:36
À : Lydie LECOUR <lydie.lecour@isospace.fr>
Cc : pierre-come.morel@fabre-lebeau.fr
Objet : Reponse a votre demande de - COMMANDE CLI. C367588 / (Votre référence : CF1900003661)

 **logo agence**

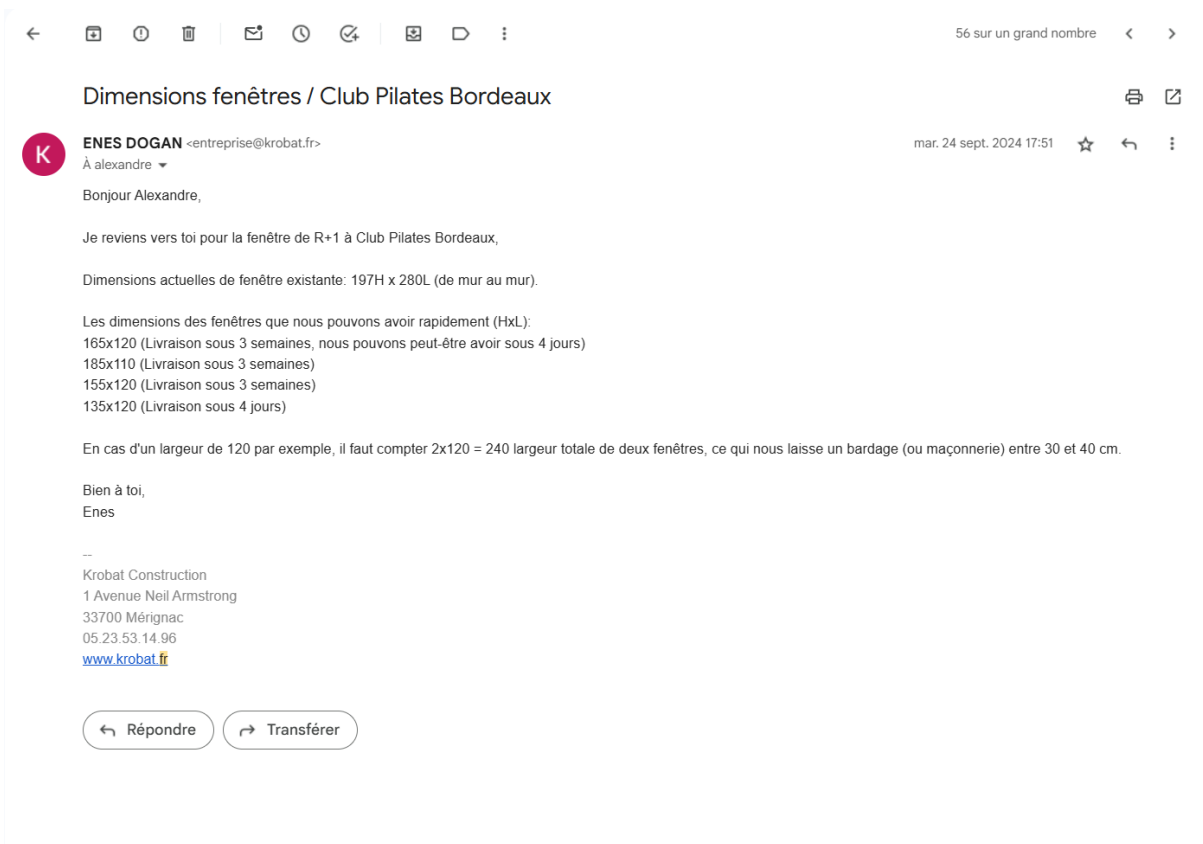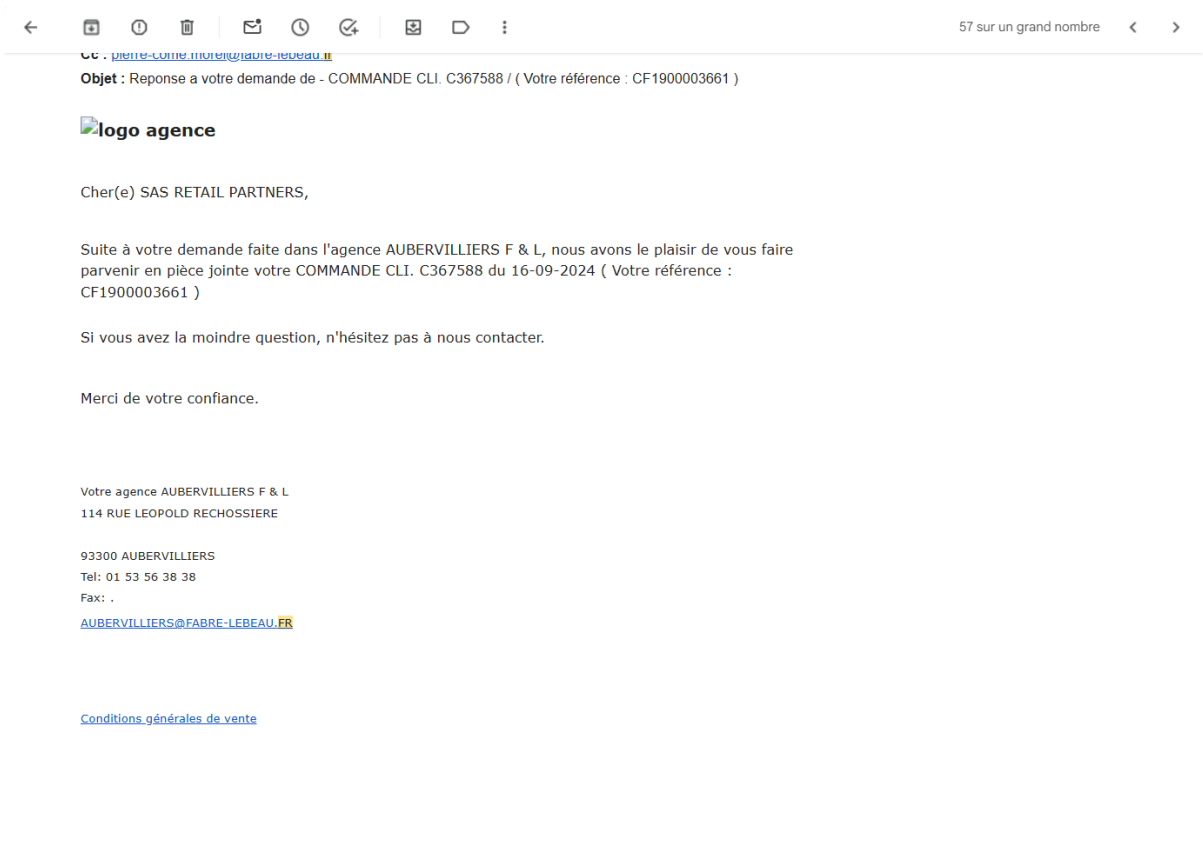

Sol / Club Pilates Bordeaux



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À alexandre ▾

mar. 24 sept. 2024 18:05 ☆ ↶ ⋮

Bonjour Alexandre,

Merci de trouver ci-joint les photos du sol ainsi que localisation des endroits présentant des irrégularités. Il y a une manque de matière dans la plupart des endroits.

Bien à toi,
Enes

—
Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

5 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



↶ Répondre

↷ Transférer

TR: Club Pilates le Bouscat - ragréage Externes Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
À moi, Emilien, Stephane, Carmen ▾

mar. 24 sept. 2024 18:43 ☆ ↶ ⋮

Enes
Merci de dégager au plus vite le rdc afin que la Sté DSV33 puisse faire ses reprises de ragréage

Bien a toi



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

De : [maman david](#)

Envoyé le : mardi 24 septembre 2024 18:37

À : [alexandre memin ATELIER17](#)

Objet : Re: Club Pilates le Bouscat - ragréage

Bonjour comme je vous avez déjà dit quand le local il
Vas être vide je peux intervenir
Merci
Envoyé de mon iPhone

Le 24 sept. 2024 à 18:25, alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr> a écrit :

David

Comme évoqué lors de la dernière réunion veuillez trouver ci-joint les photos du sol ainsi que localisation des endroits présentant des irrégularités qui nécessitent un rechargement.



Fw: TR: Commande N°CF1900003666 / RETAIL PARTNERS / MC CONCEPT

Externes

Boîte de réception x



atelier 17 <am@atelier-17.fr>

À moi ▾

mer. 25 sept. 2024 12:29



Bonjour Enes

Merci de prendre en compte le mail ci dessous et les PJ

Bien a toi

Alexandre

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

De : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

Envoyé : mercredi, septembre 25, 2024 11:40:32 AM

À : atelier 17 <am@atelier-17.fr>; Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>

Objet : TR: Commande N°CF1900003666 / RETAIL PARTNERS / MC CONCEPT

Pour info,

Tu trouveras en pièce jointe l'ar de commande.

Ainsi que le numéro de commande pour l'enlèvement de la colle par vos équipes sur Bordereaux.

Bien à vous ,



Carmen PEREZ CERVERA

Directeur de Projet

07 60 61 64 82

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe Isospace - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

De : Kelly Lopes <klopes@mcconcept78.fr>

Envoyé : mardi 24 septembre 2024 08:54

TR: DEMANDE DE PRIX - TRANSPORT PARIS - BORDEAUX

Externes

Boîte de réception x



Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>
À moi, Sophie, Catherine, Emilien, atelier ▾

mer. 25 sept. 2024 15:31 ☆ ↶ ⋮

Bonjour,

En raison des désagréments survenus ce matin, la livraison est reprogrammée pour ce soir à 22h30.

Cordialement,



Carmen PEREZ CERVERA
Directeur de Projet
07 60 61 64 82

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt
Groupe Isospace - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.



De : Catherine Bui Simple2ship <catherine.bui@simple2ship.fr>
Envoyé : lundi 23 septembre 2024 11:55
À : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>
Cc : Sophie Simple2ship <sophie.bui@simple2ship.fr>
Objet : Re: DEMANDE DE PRIX - TRANSPORT PARIS - BORDEAUX

Carmen,

Pour cette expédition, je peux vous proposer une camionnette avec hayon pouvant charger demain les 3 sites dans cet ordre (94, 93, 92) pour livraison mercredi 25/09 à 8h30 pour un forfait de 1420eur ht

Bien à vous
Catherine

CLUB PILATE Le Bouscat - Prise ne compte planning

Externes

Boîte de réception x



Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>

À moi, alexandre, Ana, Carmen, Stéphane, Julien, Zina, Laurène ▾

ven. 4 oct. 2024 12:05



Bonjour,

Suite à ma visite sur site je me permets de vous alerter encore une fois sur le planning.

@**ENES DOGAN** suite à vos engagements que je cite :

- Fin placo RDC le 05/10/24
- Fin peinture RDC le 06/10/24
- Fin sols RDC le 08/10/24

Je vous ai joint le planning **NON MODIFIABLE** pris en compte par vos soins.

RAPPEL sur les dates importantes :

- Réception client : le 15/10/24
- Réception et installation des matériaux par l'équipe USA : le 17/10/24

Je vous demande s'il vous plait de nous envoyer par mail + WhatsApp un rapport photo TOUS LES JOURS afin de pouvoir confirmer que vous respectez vos engagements, sans quoi je serais obligé de prendre des mesures correctives.

Merci à vous



Emilien COLLIN

Directeur de Projet

07 64 01 96 92

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe Isospace - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.



atelier 17 <am@atelier-17.fr>

À moi, Ana, Carmen, Stéphane, Julien, Zina, Laurène, Emilien ▼

ven. 4 oct. 2024 15:44 ☆ ↩ ⋮

Bonjour Enes

Je rebondis sur le mail d'Emilien pour te rappeler que la société DSV33 interviendra demain samedi pour une action corrective sur le ragréage du RDC.
Vous devez en amont leur identifier déblayer les zones a reprendre

Cordialement
Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

De : Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>

Envoyé : vendredi, octobre 4, 2024 12:05:58 PM

À : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>; alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

Cc : Ana ARAUJO <ana.araujo@isospace.fr>; Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>; Stéphane DUC <stephane.duc@retail-partners.eu>; Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>; Zina MERAKEB <zina.merakeb@isospace.fr>; Laurène FARDIN <laurene.fardin@retail-partners.eu>

Objet : CLUB PILATE Le Bouscat - Prise ne compte planning



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À atelier, Ana, Carmen, Stéphane, Julien, Zina, Laurène, Emilien ▼

ven. 4 oct. 2024 19:11 ☆ ↩ ⋮

Bonjour Emilien,

Bien reçu votre mail,

Nous sommes sur le chantier et nous nous efforçons d'avancer sur les tâches qui nous concernent.

Concernant les dates, c'est bien conforme pour le placo et le sol.

Par contre, la peinture RdC sera pour les tâches ponçage + 1er couche le 06/10/24.

2e couche, soit la fin de la peinture RdC sera plutôt début semaine prochaine (temps de séchage).

Réception des miroirs est prévu le Jeudi 10 Octobre (sauf les miroirs ajoutés ultérieurement 1.1, 2.1, 3.1, 6.1, 7.1, 10.1, 11.1, 12.1).

Je tiens à préciser que les délais sont très serrés, et que nous avons des commandes qui n'ont pas été reçues et validées.
Même si cela reste administratif, cela peut avoir un impact sur l'avancement des travaux.

Réception des miroirs est prévu le Jeudi 10 Octobre (sauf les miroirs ajoutés ultérieurement 1.1, 2.1, 3.1, 6.1, 7.1, 10.1, 11.1, 12.1).

Je tiens à préciser que les délais sont très serrés, et que nous avons des commandes qui n'ont pas été reçues et validées.
Même si cela reste administratif, cela peut avoir un impact sur l'avancement des travaux.

Alexandre,

Nous allons indiquer les zones à corriger. La surface d'intervention sera bien propre pour demain matin.

Je vous envoie par Whatsapp les photos.

Cordialement,

Enes

—

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr



atelier 17 <am@atelier-17.fr>

5 oct. 2024 18:22 ☆ ↶ ⋮

À moi, Ana, Carmen, Stéphane, Julien, Zina, Laurène, Emilien ▼

Bonjour Enes

Je sors du chantier à l'instant tu devais faire les carrelages et faïences aujourd'hui mais rien n'est fait, ni la peinture noire du plafond du studio...

Merci de me rappeler pour me tenir informé de ce changement de programme qui m'inquiète a nouveau

Cordialement

Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

Envoyé : vendredi, octobre 4, 2024 7:11:37 PM

À : atelier 17 <am@atelier-17.fr>

Cc : Ana ARAUJO <ana.araujo@isospace.fr>; Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>; Stéphane DUC <stephane.duc@retail-partners.eu>; Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>; Zina MERAKEB <zina.merakeb@isospace.fr>; Laurène FARDIN <laurene.fardin@retail-partners.eu>; Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>

Objet : Re: CLUB PILATE Le Bouscat - Prise ne compte planning

Je vous ferai parvenir les dimensions des vitrages une fois les encadrements des cloisons amovibles posés.

Merci de m'informer :


- État de la livraison des blocs-portes
- Dimensions du miroir n°13 (dans la salle PT room)

Je vous informerai de l'avancement des travaux.

Cordialement,
Enes DOGAN

...

9 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail ⓘ

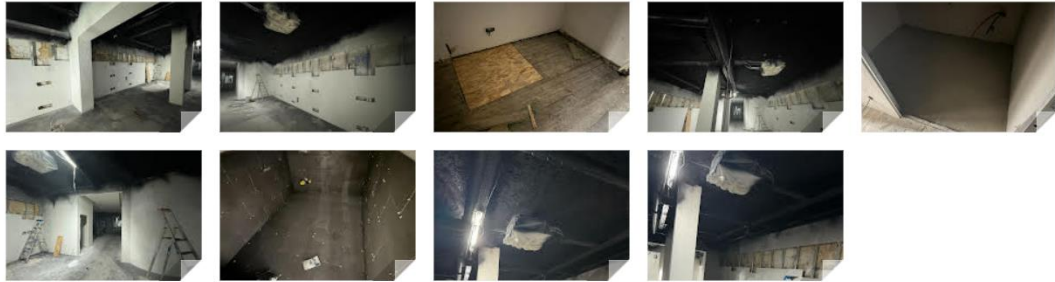

Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

7 oct. 2024 07:52 ☆ ↶ ⋮

À moi, atelier, Ana, Stéphane, Julien, Zina, Laurene, Emilien ▾

Bonjour,

Pour assurer la date de fin de chantier, nous avons impérativement besoin des dimensions des vitrages aujourd'hui en urgence. Merci de prendre les dispositions nécessaires.

Bien à vous,



Carmen PEREZ CERVERA
Directeur de Projet
07 60 61 64 82

<https://www.isospace.fr>



Une image contenant Graphique, capture d'écran, logo, Police Description



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À Carmen, atelier, Ana, Stéphane, Julien, Zina, Laurène, Emilien ▾

8 oct. 2024 00:18



Bonjour,

Merci de trouver les photos de l'avancement du chantier.

Cordialement



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À Carmen, atelier, Ana, Stéphane, Julien, Zina, Laurène, Emilien ▾

8 oct. 2024 00:22



Bonjour,

Ci-dessous les côtes des vitrages pour cloison modulaire RdC:

Cloison p40
400x1000 X 2
627x 2455 X2

Cloison p100
323x 2860. X2
1000x 790. X2
670 x 2860. X2

Cordialement

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

↳ Répondre

↶ Répondre à tous

➞ Transférer

40 sur un grand nombre

<

>

CLUB PILATES PROPRETE CHANTIER

Externes

Boîte de réception x

a

alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
À moi, Emilien, Carmen, Stephane, julien.verlhac@isospace.fr

mar. 8 oct. 2024 13:14

☆

↶

⋮

Enes
Comme déjà signalé a plusieurs reprises le chantier est dans un état d'encombrement et de saleté inacceptable !

Merci de prévoir un débarras ainsi qu'un nettoyage cet après midi .

Dans le cas contraire nous ferons intervenir une entreprise extérieure a vos frais.
-

Comptant sur votre réactivité

cordialement



Envoyé à partir de [Courier](#) pour Windows

↶ Répondre

↶ Répondre à tous

↷ Transférer

39 sur un grand nombre

<

>

CLUB PILÂTES a faire ce jour

Externes

Boîte de réception x

a

alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
À moi, Emilien, Carmen, Stephane, julien.verlhac@isospace.fr, junior.lubber@isospace.fr

mar. 8 oct. 2024 17:46

☆

↶

⋮

Enes
comme vu ce jour a faire **IMPERATIF AUJOURD'HUI**

- Découpe pour encastrement tapis de sol
- Evacuation gravois et nettoyage chantier
- Donner la date de livraison des « mapple boards »

Bien sur nous faire un point avancement photos avant de quitter le chantier

cordialement



Envoyé à partir de [Courier](#) pour Windows

↶ Répondre

↶ Répondre à tous

↷ Transférer

Club Pilates CR chantier N°5 Externes Boîte de réception x

a

alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

À moi, ecoplomberie33@gmail.com, gt.electricite@orange.fr, maman, Alain, Emilien, junior.lubber@isospace.fr, Carmen, Stephane, julien.verlhac@isospace.fr ▼

Bonjour a tous

Vous trouverez en PJ le CRN°5 du projet Club Pilates

Information importante / le mobilier du LOBBY sera livré et mis en place le 10/10/24 cette zone doit donc impérativement être terminée pour le 09/10

Comme prévu la reception avec le client se déroulera le 15/10/2024 aussi nous ferons une pré-reception le 13/10 a 9h00 (votre présence est requise).

D'ici là nous comptons sur votre engagement pour déployer les toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour tenir cette date

Bien cordialement



Envoyé à partir de [Courier](#) pour Windows

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ

Devis TS / Club Pilates Externes Boîte de réception x

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À alexandre ▾

Bonjour Alexandre,

Merci bien de trouver ci-joint le devis des TS réalisés / en cours de réalisation pour Club Pilates Bordeaux.

Bien à toi,
Enes

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



a

am@atelier-17.fr <am@atelier-17.fr>

À emilien.collin@isospace.fr, stephane.duc@isospace.fr, julien.verlhac@isospace.fr, moi ▾

Bonsoir Enes

Nous prenons bonne note de ce devis de TS que nous étudierons avec attention a la fin du projet en faisant les + et les - réalisés pour chaque lot.

37 sur un grand nombre

a

am@atelier-17.fr <am@atelier-17.fr>
À emilien.collin@isospace.fr, stephane.duc@isospace.fr, julien.verlhac@isospace.fr, moi

mer. 9 oct. 2024 19:53

☆ ↶ ⋮

Bonsoir Enes

Nous prenons bonne note de ce devis de TS que nous étudierons avec attention a la fin du projet en faisant les + et les - réalisés pour chaque lot.

Bien à toi

A17

ALEXANDRE MÉMIN
ATELIER 17
OPC-MOE-AMO
06 63 80 22 36

From: ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
Sent: Wednesday, October 9, 2024 7:24 PM
To: alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
Subject: Devis TS / Club Pilates

...

[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail

KROBAT

Devis

Devis_D2024000...

37 sur un grand nombre

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail

KROBAT

Devis

Devis_D2024000...

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À am@atelier-17.fr, emilien.collin@isospace.fr, stephane.duc@isospace.fr, julien.verlhac@isospace.fr

mer. 9 oct. 2024 20:21

☆ ↶ ⋮

Bonsoir Alexandre,

Très bien, entendu.

Merci bien,
Enes

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

↳ Répondre

↶ Répondre à tous

↷ Transférer

CLUB PILATES ACTIONS URGENTES Externes Boîte de réception x

a

alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

À moi, Emilien, Carmen, junior.lubber@isospace.fr, julien.verlhac@isospace.fr, Stephane ▾

mar. 8 oct. 2024 19:18 ☆ ↩ ⋮

ENES,

Malgré nos nombreuses relances force est de constater le retard accumulé aussi pour ne pas mettre plus en péril le chantier nous avons acté ensemble ce jour en réunion les points suivants :

- Début de la mise en peinture des murs et reprise des manques peinture noire plafond studio 09/10 fin 10/10 effectif minimum 2 pers
- Finition et reprise BA 13au RDC finir pour le 09/10 effectif 3 pers
- Plafonds 600x600 RDC finir pour le 10/10 effectif « équipe BA13 »
- Carrelages RDC et R+1 finir 09/10 effectif 2 pers
- Livraison et pose des miroirs le 10/10 (équipe spécifique)
- Pose des plinthes 09/10
- Faire découpe pour tapis de sol 08/10
- Débarras et nettoyage 08/10
- Donner date de livraison « maple boards » 08/10

Pour mémoire la zone LOBBY doit être impérativement terminée pour le 09/10 au soir



Envoyé à partir de [Courier](#) pour Windows

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À alexandre, Emilien, Carmen, junior.lubber@isospace.fr, julien.verlhac@isospace.fr, Stephane ▾

mer. 9 oct. 2024 22:57 ☆ ↩ ⋮

Bonjour,

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À alexandre, Emilien, Carmen, junior.lubber@isospace.fr, julien.verlhac@isospace.fr, Stephane ▾

mer. 9 oct. 2024 22:57

Bonjour,

Merci de trouver ci-joint les photos du chantier.

Pour information, nous avons réalisé aujourd'hui:

- Peinture accueil, PT Room et Sanitaire RdC
- Mise en places des renforts (3 niveaux) -> Réalisé à 70%.
- Calfatements des espace entre cloison / plafond
- Enduit Chambre 1 à R+1
- Faux plafond au RdC (les dalles seront posées demain)
- Plinthes RdC (il manque acrylique niveau Studio qui sera réalisé demain)

Merci bien,
Cordialement

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

5 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



35 sur un grand nombre

URGENT - TO DO LIST EXE CLUB PILATE BORDEAUX

Externes

Boîte de réception x

E

Emilien COLLIN

<emilien.collin@isospace.fr>

À alexandre, moi, Junior, Julien, Ana, Stéphane, Laurène

jeu. 10 oct. 2024 10:43

☆

↶

⋮

Bonjour à tous,

Suite à ma visite d'hier voici les points d'attentions **URGENT** à traiter.

==COMMUN== **<12/10/24**

Un nettoyage complet doit être réalisé compris, dépoussiérage et mise en peinture de propreté Au vu de l'état dans lequel ont été mis les murs, suite aux manutentions de matériaux.
Aucune protection n'est installée pour protéger ses murs de ce fait, une peinture De propreté blanche doit être faite sur les espaces communs du rez-de-chaussée et la montée d'escalier.

==RDC==

Lobby: **<11/10/24**

- les goulottes dans la gorge lumineuse
- Faire la peinture De la vitrine.
- Finir l'entrée ragréage + entrée sol PVC
- Finir la peinture et les joints acryliques au droit des plinthes
- Peinture, à ne pas oublier à l'entrée (actuellement en vert) Au niveau du sas de l'entrée.

poser des plaintes dans le local vestiaire

- fermer le faux plafond dans le local vestiaire

Rappel !! La zone doit être équipée et entièrement libéré pour le jeudi 10 octobre.

Studio: **<13/10/24**

- Poser les vitrages dans la cloison, modulaire
- poser la porte carrées dans la cloison modulaire
- terminer les renforts pour les miroirs, Spring, Board
- poser les plaintes, dont toute la pièce
- poser les miroirs dans toutes les salles
- faire la mise en peinture des murs, non recouverts.
- Poser les luminaires.

35 sur un grand nombre



Emilien COLLIN

Directeur de Projet

07 64 01 96 92

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe Isospace - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

...

[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)

K

ENES DOGAN

<entreprise@krobat.fr>

À Emilien, alexandre, Junior, Julien, Ana, Stéphane, Laurène

ven. 11 oct. 2024 07:57

☆

↶

⋮

Bonjour,

Merci de trouver ci-joint les photos du chantier d'hier soir.

Nous avons réalisé:

- Renforts et pose miroirs (terminé)
- Faux plafond RdC (terminé)
- Avancement de la peinture (80%)
- Plinthes (terminé)

Cordialement
Enes DOGAN

34 sur un grand nombre

<

>

Club pilates 12/10

Externes

Boîte de réception x

a

atelier 17 <am@atelier-17.fr>

À moi, Emilien, junior.lubber@isospace.fr, Stephane, Julien

Bonjour

Ce jour 9:30 malgré nos échanges d'hier un seul peintre présent (contre 3 prévus)

Pas de plaquistes

Et toujours personne pour réaliser le tapis de sol de l'entrée (photo en PJ)

Merci de nous faire un retour d'urgence sur ces points

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

1 pièce jointe

Analyse effectuée par Gmail



↳ Répondre

↶ Répondre à tous

➦ Transférer

31 sur un grand nombre

<

>

Club pilates !!! URGENT !!!

Externes

Boîte de réception x

a

atelier 17 <am@atelier-17.fr>

À moi, junior.lubber@isospace.fr, Emilien, Stephane, Julien

Enes

Notre pilote Junior Lubber vient de constater un défaut de fixation des renforts bois TRX que vous avez réalisés

.

Merci de venir constater le désordre et y remédier ce jour

Dans l'attente

Cdt

Alexandre Mémin

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À atelier, junior.lubber@isospace.fr, Emilien, Stephane, Julien

Bonjour,

Bien reçu,

Je viens avec notre menuisier cet apres midi pour constater la situation.

Bien Cordialement,

Enes

Krobat Construction

1 Avenue Neil Armstrong

33700 Mérignac

05.23.53.14.96

www.krobat.fr

...

30 sur un grand nombre

Club Pilates fixation TRX

Externes

Boîte de réception x

a

atelier 17 <am@atelier-17.fr>
À moi, junior.lubber@isospace.fr, Emilien, Julien

lun. 14 oct. 2024 12:24

Enes

Comme vu ce matin les fixations des supports de TRX ne sont pas adaptées au support .
Merci de faire un test avec des chevilles chimiques sous la direction de Junior Lubber qui validera la bonne mise en œuvre.
Si le test est concluant il conviendra de reprendre la totalité des supports suivants le même procédé.

Merci de veiller à ce que vous équipes soient en possession du matériel adapté à cette tâche (scie électrique circulaire, perforateur, mèches ,etc...) afin de garantir un résultat attendu dans un temps optimisé.

Bien cordialement
Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À atelier, junior.lubber@isospace.fr, Emilien, Julien

lun. 14 oct. 2024 12:51

Bonjour Alexandre,

Je suis sur place et nous avons ce qu'il faut pour avancer.

Nous avons réalisé un parcement de 12 cm de profondeur sur le mur. Nous attendons que le premier panneau soit finalisé avec des chevilles chimiques.

Ce sont les murs de Bordeaux qui ne tiennent pas comme on l'a vu ce matin.

Je vous tiendrai informé dès que le premier essai sera finalisé.

Cordialement,
Enes

28 sur un grand nombre

Club pilates point effectifs

Externes

Boîte de réception x

a

atelier 17 <am@atelier-17.fr>
À moi, Emilien, junior.lubber@isospace.fr, Stephane, Julien

mar. 15 oct. 2024 11:10

Enes

A 11h il n'y a qu'un menuisier et un peintre !

Ce n'est pas ce qui était prévu hier .et jamais tu ne pourras tenir les délais annoncés hier

Merci de renforcer les équipes dès maintenant.

Dans l'attente de confirmation par retour de mail

Cdt
Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

↳ Répondre

↵ Répondre à tous

→ Transférer

27 sur un grand nombre

Club Pilates

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À alexandre, Julien, Emilien

mar, 15 oct. 2024 15:29

Bonjour,

Nous nous efforçons de réaliser l'ensemble des travaux qui nous ont été confié. Malgré notre effort, je voudrais vous informer que nous ne seront pas en mesure de réaliser les travaux suivants:

COMMANDE N°CF1900003659 -> Ponçage et vitrification de parquet / Localisation: Appartement

Est-il possible d'enlever de notre marché ce lot ? Merci bien d'avance,

Cordialement

Enes DOGAN

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

Répondre

Répondre à tous

Transférer

26 sur un grand nombre

Club Pilates actions Externes Boîte de réception x

a

am@atelier-17.fr
À moi, Emilien, Junior, Stéphane, Julien

mar, 15 oct. 2024 16:45

Enes

je compte sur toi pour respecter les engagements pris ce jour :

14/11

- pose des vitrages des cloisons modulaires et porte clarite de la PT room
- Pose PVC à l'entrée et finition PVC PT room
- évacuation des gravois et matériaux non utilisés
- Rangement propre des matériaux au R+1

15/11

- Avant 10h00, nettoyage des ouvrages réalisés (carrelages, PVC, cloisons ,portes,etc...)
- A partir de 10h00 personne au Rdc travaux uniquement au R+1 le temps de la reception avec le client

cordialement

A17

ALEXANDRE MÉMIN
ATELIER 17
OPC-MOE-AMO
06 63 60 22 36

...

[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)

Répondre

Répondre à tous

Transférer

25 sur un grand nombre

Club Pilates reception client

Externes

Boîte de réception x

a

am@atelier-17.fr

À moi, gt.electricite, Emilien, Junior, Stéphane, Julien

mar. 15 oct. 2024 16:54

Messieurs

En raison de la reception client qui se déroulera demain 16/10 à 11h00 merci de bien vouloir laisser la zone rdc sans travaux ,dégagée de tous gravois ,matériaux et outillage et PROPRE.

Merci de concentrer vos actions au R+1 pendant la reception en évitant les travaux bruyants.

Comptant sur votre compréhension

Bien cordialement

A17

ALEXANDRE MÉMIN

ATELIER 17

OPC-MOI-E-AMO

06 63 60 22 36

...

[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)

Répondre

Répondre à tous

Transférer

24 sur un grand nombre

Cloison amovible / Club Pilates Bordeaux

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À alexandre, Emilien, Stéphane, Julien

mar. 15 oct. 2024 20:19

Bonjour,

Nous avons commencé la montage des vitres des cloisons amovibles aujourd'hui suite à la livraison des vitrages en fin de matinée.

Nous avons un soucis au niveau de joints / vitrages qui nous empêche de mettre en place les vitres. Le soucis est que les joints qui sont livrés avec cloison sont pour les vitrages 33.2. Sauf que les vitrages livrés aujourd'hui sont des vitrages 55.2. Ce qui rends impossible la mise en place. Il faut:

- Soit changer les vitrages afin de remplacer avec 33.2

- Soit changer les joints et apporter des joints fins compatibles avec des vitrages 55.2.

Nous avons installé la porte clarite.

Merci d'avance,

Cordialement

Enes DOGAN

...

Krobat Construction

1 Avenue Neil Armstrong

33700 Mérignac

05.23.53.14.96

www.krobat.fr

Répondre

Répondre à tous

Transférer

23 sur un grand nombre

<>

Club Pilates rdv fin de chantier

Externes

Boîte de réception x

a

atelier 17 <am@atelier-17.fr>
À moi, junior.lubber@isospace.fr, Emilien, Stephane, Julien

jeu. 17 oct. 2024 18:39

☆ ↶ ⋮

Enes

Pour faire suite a notre réunion de ce matin avec Julien Verhac je te donne rdv demain 18/10/2024 a 9:30 pour faire le point sur les travaux effectués et restants .

Cette réunion valant arrêt des travaux pour l'entreprise Krobat.

Nous ferons également un point sur les matériaux

Merci de te munir de tes commandes et devis

Bien cordialement

Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

↶ Répondre

↶ Répondre à tous

↷ Transférer

22 sur un grand nombre

<>

Club Pilates

Externes

Boîte de réception x

a

atelier 17 <am@atelier-17.fr>
À moi, Emilien, Julien, junior.lubber@isospace.fr, Stephane

lun. 21 oct. 2024 14:01

☆ ↶ ⋮

Enes

Pour faire suite à notre rdv de vendredi dernier merci de bien vouloir revenir vers moi aujourd'hui pour caler une date d'intervention cette semaine (idéalement jeudi) pour finaliser les réserves sur le carrelage .

Cordialement

Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

6 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail













K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À atelier, Emilien, Julien, junior.lubber@isospace.fr, Stephane

lun. 21 oct. 2024 16:21

☆ ↶ ⋮

Bonjour Alexandre,

Bien reçu, c'est bon pour l'intervention Jeudi 24 afin d'effectuer la reprise des réserves.

Cordialement,

Enes DOGAN

...

21 sur un grand nombre

Club Pilates faux plafond

Externes

Boîte de réception x

a

atelier 17 <am@atelier-17.fr>
À moi, junior.lubber@isospace.fr, Emilien, Julien, Stephane

jeu. 24 oct. 2024 07:38

Enes
Comme convenu lors de notre rdv " DGD" de vendredi dernier merci de nous livrer avant demain (vendredi) midi le complément de matériaux nécessaires à la réalisation des faux plafonds modulaires 600x600 du R+1 prévus au marché.

Bien cordialement

Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

Répondre

Répondre à tous

Transférer

20 sur un grand nombre

TR:

Externes

Boîte de réception x

a

am@atelier-17.fr
À moi, junior.lubber, Emilien, Stéphane, Julien

lun. 28 oct. 2024 08:21

Enes
Comme évoqué hier merci de reprendre ce jour
RDC

- Barre de seuil WC a poser
- Cales miroirs a déposer

R+1

- SDB finalier le carrelage + barre de seuil
- SDB Baguette murale de finition entre faïence et BA13
- SDB bouche VMC
- WC baguette finition sur faïence gébérít
- WC barre de seuil
- cuisine finalier le carrelage + barre de seuil

voir avec Junior pour le matériel manquant

- faux plafond
- porte a galandage
- capuchons paumelles
- ...

cordialement

A17

ALEXANDRE MÉMIN
ATELIER 17
OPC-MOE-AMO
06 63 80 22 36

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

20 sur un grand nombre

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À am, junior.lubber, Emilien, Stéphane, Julien

lun. 28 oct. 2024 22:02

Bonjour Alexandre,


L'ensemble des tâches sont réalisées aujourd'hui. Il nous reste la barre de rattrapage de la salle de bain que nous allons réaliser d'ici Jeudi (barre de rattrapage en bois).

J'ai également livré aujourd'hui un nouveau kit de la porte coulissante.

Bien à toi,
Enes

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

9 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail



19 sur un grand nombre

Club Pilates miroirs

Externes

Boîte de réception x

a

atelier 17 <am@atelier-17.fr>

À moi, junior.lubber@isospace.fr, Emilien, Stéphane, Julien

lun. 28 oct. 2024 13:56

Enes

J'ai eu confirmation des clients, ok pour la pose des miroirs jeudi.

Cordialement
Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À atelier, junior.lubber@isospace.fr, Emilien, Stéphane, Julien

lun. 28 oct. 2024 22:06

Très bien, merci pour la confirmation.

Cordialement,
Enes

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

Répondre

Répondre à tous

Transférer

18 sur un grand nombre

<

>

Club Pilates Miroirs hors cotes

Externes

Boîte de réception x

a

atelier 17 <am@atelier-17.fr>

À moi, Emilien, junior.lubber@isospace.fr, Stephane, Julien

jeu. 31 oct. 2024 11:37

☆

↶

⋮

Bonjour

Merci de nous confirmer la pose des miroirs hors côtes ce jour comme convenu et de nous faire parvenir des photos suite a la pose .

Merci également de nous transmettre la fiche technique de la colle utilisée.

PS :

Vous intervenez dans un site réceptionné merci de prendre les précautions et mesures conservatoires d'usage et d'assurer le nettoyage après intervention .

Cordialement

Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À atelier, Emilien, junior.lubber@isospace.fr, Stephane, Julien

jeu. 31 oct. 2024 15:37

☆

↶

⋮

Bonjour Alexandre,

Nous avons posé les miroirs aujourd'hui.

Les photos ci-joint, ainsi que la fiche technique de la colle.

Nous interviendrons lundi pour nettoyer les vitres et retirer le ruban adhésif sur les miroirs.

Bien à toi,

Enes

...

...

Krobat Construction

17 sur un grand nombre

<

>

Club Pilates devis miroir #13

Externes

Boîte de réception x

a

atelier 17 <am@atelier-17.fr>

À moi, Emilien

mar. 5 nov. 2024 20:44

☆

↶

⋮

Enes comme discuté hier nous attendions aujourd'hui ton devis et délais pour la fourniture et pose du miroir #13 de la PT room.

Sauf erreur nous n'avons rien reçu .

Merci de bien vouloir nous transmettre ton offre d'ici demain 11h.

Comptant sur ton engagement

Cordialement

Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À atelier, Emilien

mer. 6 nov. 2024 06:20

☆

↶

⋮

Bonjour Alexandre,

Je suis désolé je n'avait pas reçu la confirmation des éléments de livraison.

Nous sommes sur la semaine 48 pour la livraison, soit la semaine de 25 Novembre.

Bien à toi,

Enes

...

...

Krobat Construction

1 Avenue Neil Armstrong

33700 Mérignac

05.23.53.14.96

www.krobat.fr

17 sur un grand nombre

K

ENES DOGAN

<entreprise@krobat.fr>

À atelier, Emilien

mer. 6 nov. 2024 10:18

Bonjour Alexandre,

J'attends de l'information pour avoir des délais plus rapide. J'attends le retour, je te tiendrais informé dans la journée si un délais plus rapide.

Bien à toi,
Enes

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

K

ENES DOGAN

<entreprise@krobat.fr>

À atelier, Emilien

mer. 6 nov. 2024 11:18

Bonjour Alexandre,

Sous réserve de validation de fabricant, nous pouvons recevoir les miroirs Jeudi de la semaine prochaine.

Répondre

Répondre à tous

Transférer
